



**Muş Alparslan
Üniversitesi**

**2022 YILI YATIRIM İZLEME
ve
DEĞERLENDİRME RAPORU**

**Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
MART - 2023**



Muş Alparslan Üniversitesi

2022 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

**Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Mart - 2023**

İÇİNDEKİLER

1. YÖNETİCİ ÖZETİ	1
2. GENEL DEĞERLENDİRME	2
2.1 Kuruluşun Görevi (Misyonu)	2
2.2 Kuruluşun Hedefi (Vizyonu)	2
2.3 Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri.....	3
2.4 Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları	3
2.5 Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi.....	5
2.6 2022 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı	6
2.6.1 2009H03152561 Kampüs Altyapısı	6
2.6.2 2009H031067 Derslik ve Merkezi Birimler.....	7
2.6.3 2010H051271 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	7
2.6.4 2010K121230 Merkezi Araştırma Laboratuvarı	8
2.6.5 2020K12152015 İhtisaslaşma Projesi (Makine ve Teçhizat Alımı)	8
2.6.6 2022H03186907 Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi.....	8
2.6.7 2022H0386903 Muhtelif İşler	8
2.6.8 2022H03186905 Yayın Alımları.....	9
2.7 Hibe Kapsamındaki Yatırımlar.....	9
2.8 2022 Yılı Yatırım Uygulamaları	10
2.8.1 Genel Yatırım Uygulama Durumu.....	10
2.8.2 Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar.....	10
3. 2022 YILI PROJE UYGULAMALARI	10
3.1 Devam Eden Projeler.....	10
3.1.1 Kamu Yatırım Projeleri	10
3.1.1.1 2009H03152561 Kampüs Altyapısı	10
3.1.1.2 2009H031067 Derslik ve Merkezi Birimler.....	10
3.1.1.3 2010H051271 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	11
3.1.1.4 2010K121230 Merkezi Araştırma Laboratuvarı	11
3.1.1.5 2020K12152015 İhtisaslaşma Projesi (Makine ve Teçhizat Alımı)	11
3.1.1.6 2022H03186907 Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi	11
3.1.1.7 2022H0386903 Muhtelif İşler	11
3.1.1.7.1 Yazılım Alımları	11
3.1.1.7.2 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	12
3.1.1.7.3 Bina Bakım-Onarım Giderleri.....	12
3.1.1.7.4 Makine-Teçhizat ve Mefruşat Alımları.....	12
3.1.1.7.5 Bilgisayar Alımları	13
3.1.1.8 2022H03186905 Yayın Alımları	13
3.2 Tamamlanan Projeler.....	13
3.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi.....	13
3.2.2 Proje Tamamlama Raporu	14
4. ÖNERİLER	17

TABLÖLAR

Tablo 1 2022 Yılı Projeler, Ödenekler ve Kaynaklar	4
Tablo 2 Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi	5
Tablo 3 İnşaatı Devam Eden-Tamamlanan Projeler	6
Tablo 4 Bina Bakım-Onarım Giderleri.....	12
Tablo 5 Makine-Teçhizat ve Mefruşat Alımları	12
Tablo 6 Bilgisayar Alımları	13
Tablo 7 Yayın Alımları.....	13
Tablo 8 Tamamlanan Projelerin Listesi.....	13
Tablo 9 Proje Tamamlanma Raporu.....	14
Tablo 10 2022 Yılı Kamu Yatırımları Özeti	18

1. YÖNETİCİ ÖZETİ

Muş Alparslan Üniversitesi, 5662 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun” 29.05.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle kurulmuştur.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi için devam eden yatırım projelerinin süratle hayata geçirilmesinin elzem olduğu izahıta varededir. Bu kapsamda devletimiz tarafından uhdemize tevdi edilen 2022 yılı ödenekleri ile yatırımların etkin, ekonomik, verimli ve en kısa zamanda tamamlanmasına çalışılmış, iç ve dış paydaşlarla birlikte koordineli çalışmalar yürütülmüştür. Nitekim yılsonu itibarı ile külliyesimizin altyapısı ile fiziki yapılarına dair projelerin bir kısmı tamamlanmış, Stratejik Plan’da belirtilen diğer yatırım projelerinin tamamlanması için de çalışmalarına hız verilmiştir.

Esasen üniversitelerin öncelikli hedeflerinden olan eğitim-öğretim ve Ar-Ge faaliyetlerinin yanı sıra bilime katkı sunmak ve bunları ulusal ve uluslararası çapta kullanıma sunmak hususlarında akademik ve idari personelimizin kayda değer çalışmaları olmuştur. Tüm bu çalışmaların toplamda nihai hedefi ülkemizin bilim, teknoloji ve kültür hayatına katkıda bulunan, toplumla iş birliğini güçlendiren, evrensel değerlere sahip, bilgi birikimi yüksek bir üniversite olmaktır.

Üniversitenin “2022 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu”, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci ve 60'ıncı maddeleri ile 5436 sayılı kanunun 15'inci maddesi, “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin” 24'üncü maddesi uyarınca; hesap verilebilirliğin sağlanması ve yatırım harcamalarının verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Prof. Dr. Fethi Ahmet POLAT

Rektör

2. GENEL DEĞERLENDİRME

2.1 Kuruluşun Görevi (Misyonu)

Toplumsal sorumluluk bilinciyle eğitim-öğretim, araştırma ve girişimcilik alanında bilgi ve teknoloji üreten, dijitalleşme ve kalite anlayışı çerçevesinde öncü bir üniversite olmaktır.

2.2 Kuruluşun Hedefi (Vizyonu)

Üniversite-toplum-sanayi işbirliğini esas alarak, sosyal bilimler ağırlıklı olmak üzere, fen ve mesleki eğitimde mevcut alanlarda nitelikli eğitim kalitesi ile araştırma ve proje faaliyetleri yürüten, toplam kalite anlayışı çerçevesinde ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen saygın bir üniversite olmaktır.

2.3 Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri

Stratejik Amaç 1: Kurum Kültürünü, Kimliğini, Kurumsal Hafıza ve Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek/Güçlendirmek.

Hedef.1.1 : Üniversitede aidiyet duygusu ve kurumsal kültürün geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,

Hedef.1.2 Eğitim–araştırma, sosyal ve kültürel alanlar ile idari alanların fiziki altyapısını ve teknolojik donatısının iyileştirilmesi

Hedef.1.3 Kurumsallaşmış kaliteli yönetim anlayışının üniversitenin tüm süreçlerine uygulamak, akademik ve idari personeli kurum kültürü ve toplam kalite yönetimi konusunda bilgilendirilmesi,

Hedef.1.4 Kurumsal hafızanın güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapması, bilgi güvenliğini sağlayacak sistemleri faaliyete geçirilmesi ve gerektiğinde iç ve dış paydaşların bilgisine sunulması,

Hedef.1.5 Kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması.

Stratejik Amaç 2: Bilgi ve Teknoloji Üretecek Altyapıyı Geliştirmek, Ulusal ve Uluslararası Araştırma ve Yayın Sayısını Arttırmak,

Hedef.2.1 Öğretim elemanı başına düşen uluslararası endekslerdeki yayın sayısı ile ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlik sayısının artırılması,

Hedef.2.2 Merkezi araştırma laboratuvarı ve akademik birimlerin ihtiyaç duyduğu laboratuvar alt yapısının tamamlanması/geliştirilmesi,

Hedef.2.3 Lisansüstü programların nitelik ve nicelik yönünde güçlendirilmesi,

Hedef.2.4 Bölgesel Kalkınma Odaklı Milyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı kapsamında “hayvancılık ”la ilgili araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.

Stratejik Amaç 3: Eğitim-Öğretim Kalitesini Geliştirerek Ülkenin İhtiyaç Duyduğu Nitelikli İnsan Kaynağını Yetiştirmek,

Hedef.3.1 Uzaktan öğretim faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, uzaktan öğretim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanılması,

Hedef 3.2: “Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm” programı kapsamında pilot üniversite olarak eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

Hedef.3.3: Ulusal ve uluslararası değişim programları bağlamında faaliyet sayısının arttırılması,

Hedef.3.4: Ön lisans ve lisans eğitim programlarının nitelik ve niceliksel olarak geliştirilmesi, nitelikli öğrenci sayısının arttırılması.

Stratejik Amaç 4: Paydaşlarla İşbirliği İçerisinde Çevresel, Kültürel ve Sosyal Gelişmeye Yönelik Faaliyetleri, Toplumsal Sorumluluk Bilinciyle Gerçekleştirmek.

Hedef.4.1: Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilen eğitim program çeşitliliğinin arttırılması,

Hedef.4.2: Mezunlarımızla ilişkilerin güçlendirilmesi ve mezun takip sisteminin aktif olarak kullanılması,

Hedef.4.3: Öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin arttırılması,

Hedef.4.4: Girişimcilikle ilgili eğitim ve proje faaliyetlerinin geliştirilmesi,

Hedef.4.5: Bölgesel ve çevresel kalkınmayı destekleyecek uygulanabilir projelerin geliştirilmesi.

2.4 Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları

Üniversite, 5018 sayılı Kanun’da (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli bir kurumdur.

Gelirleri ise;

a) Hazine yardımları,

b) Öz gelirlere oluşmaktadır.

Üniversitemizin 2022 yılına ait proje, ödenek ve kaynakları Tablo 1’de gösterilmiştir.

2022 Yılı Projeler, Ödenekler ve Kaynaklar


Tablo 1

Sektör	Proje Numarası	Proje Adı	2022 Yılı Bütçe Ödenek ve Kaynakları			
			Özel Bütçe		Likit Karşılığı Ekleme	Toplam
			Hazine	Öz Gelir		
Eğitim	2009H031067	Derslik ve Merkezi Birimler	23.000.000	-	-	23.000.000
	2009HO3152561	Kampüs Altyapısı	1.500.000	-	-	1.500.000
	2022H03186907	Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projeleri	200.000	-	-	200.000
	2022H03186903	Muhtelif İşler	11.000.000	-	3.521.000	14.521.000
	2022H03186905	Yayın Alımları	500.000	-	-	500.000
Spor	2010H051271	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2.500.000	-	-	2.500.000
DKH	2010K121312	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	2.000	-	-	2.000
	2022K12152015	İhtisaslaşma Projesi (Makine ve Teçhizat Alımı)	3.000.000	-	-	3.000.000
Genel Toplam			41.702.000		3.521.000	45.223.000

2022 yılında yatırım projelerine ilişkin olarak, aktarma ve ekleme dâhil tahsis edilen ödenek dağılımını aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Yatırım Bütçesinin Projelere Dağılım Grafiği

Grafik 1

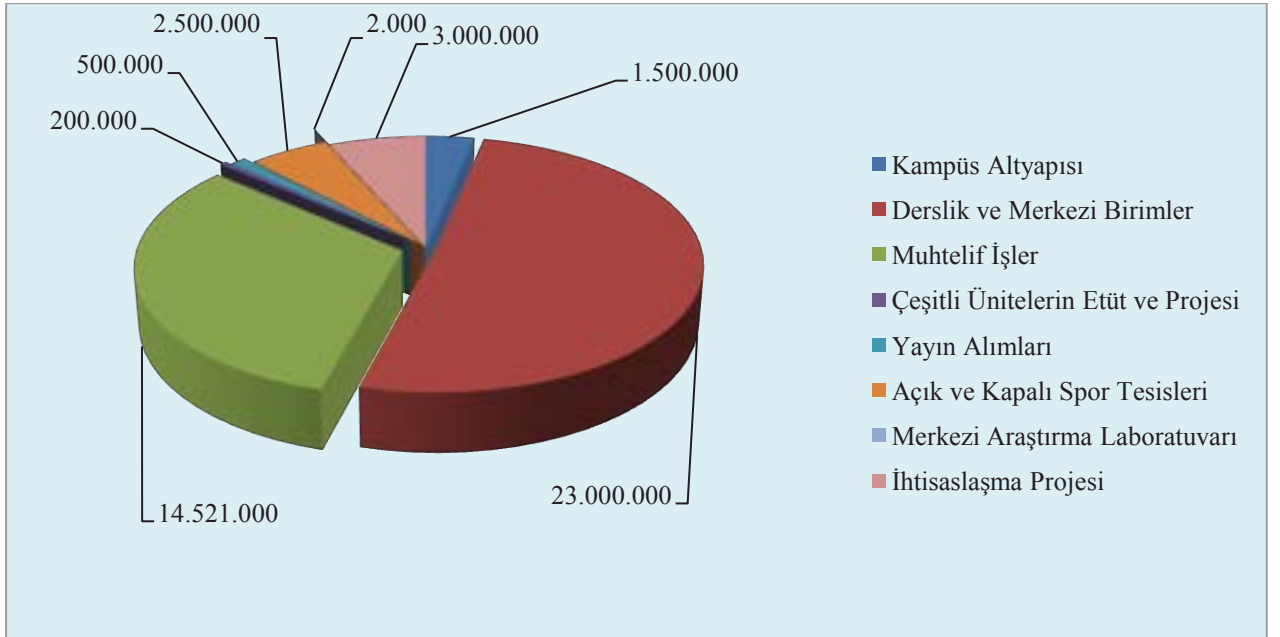

2.5 Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi

Üniversite; 10 Fakülte, 2 Enstitü, 6 Meslek Yüksekokulu ile hizmet vermektedir. Bu birimler, hizmetlerini toplam 2.136.332 m²'lik yerleşke alanı üzerindeki 155.539 m²'lik kapalı alanda sürdürmektedir. Üniversitenin hizmet sunduğu açık ve kapalı alanların detayları Tablo 2'de verilmiştir.

Tablo 2

Mevcut Yerleşkeler		Kapalı Alan (m ²)	Yerleşke Alanı (m ²)	Mülkiyet Durumu	Açıklama
Kampüs Alanı	Rektörlük Hizmet Binası	8.000	2.000.000	Maliye Hazinesi	Külliyeye Yerleşkesi
	Eğitim Fakültesi	55.600			
	Fen Edebiyat Fakültesi				
	Mühendislik-Mimarlık Fakültesi				
	İletişim Fakültesi				
	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi				
	Sağlık Bilimleri Fakültesi				
	Spor Bilimleri Fakültesi				
	Uygulamalı Bilimler Fakültesi				
	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu				
	Fen Bilimleri Enstitüsü				
	Sosyal Bilimler Enstitüsü	9.360			
	Kütüphane ve Bilgi İşlem Merkezi	6.186			
	Merkezi Kafeterya	6.000			
	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	16.500			
	Lojmanlar	6.000			
	Konuk Evi	7.500			
	1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi	1.850			
	Külliyeye Isı Merkezi	9.000			
Kapalı Spor Salonu	2.000				
Külliyeye Çarşısı	2.250				
Hangar	2.250				
Çiftlik		108.000	Maliye Hazinesi	Çiftlik Yerleşkesi	
Çarşı(İslami İlimler)	14.000	7.200	Maliye Hazinesi	Çarşı Yerleşkesi	
Malazgirt Meslek Yüksekokulu	4.800	12.500	Maliye Hazinesi	MMYO Yerleşkesi	
Bulanık Meslek Yüksekokulu	6.493	8.632	Tahsis	Bulanık MYO Yerleşkesi	
Varto Meslek Yüksekokulu	-	-	-	-	
Genel Toplam	155.539	2.136.332			

2.6 2022 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

2022 yılında 1 adet yapım işi tamamlanmış olup 2 adet yapım işi Rektörlük oluru ile fesih edilmiştir.

İnşaatı Devam Eden-Tamamlanan Projeler

Tablo 3

Sıra No	Projenin Adı	Karakteristiği	Başlama ve Hedeflenen Bitiş Tarihleri	Tamamlanma Oranı
1	2009HO3152561 Kampüs Altyapısı			
	Kampüs Altyapısı (Genel)	140.000 m ²	2022-2022	% 100
2	2009H031067 Derslik ve Merkezi Birimler			
	Malazgirt MYO	4.215 m ²	2021-2022	% 17
	İslami İlimler Fakültesi	14.000 m ²	2020-2022	% 100
3	2010H051271 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri			
	Açık Spor Tesisleri	Açık Tenis Kortu (2 Adet), Basketbol Sh. (1 Adet), Tri. Sen. At. Pis. Futbol Sh. (3.000 Sey. Kap.) BESYO (3.500 m ²)	2020-2022	% 36

2.6.1 2009HO3152561 Kampüs Altyapısı

“Kampüs Altyapısı” projesine bağlı olarak, 2022 yılında ihalesi yapılan “Kampüs Altyapı Tadilatları ve Çarşı Binası Çevre Düzenleme Yapım İşİ”, “Ağaçlandırma Alanları Damla sulama Yapım İşİ” ve “Trafo ve Jeneratör Grupları Deplase Yapım İşİ” 2022 yılsonu itibariyle % 100 tamamlanmıştır.

Resim 1 Merkez Külliye Alanı



2.6.2 2009H031067 Derslik ve Merkezi Birimler

“Derslik ve Merkezi Birimler” projesine baęlı olarak; 2022 yılında ihalesi yapılan 4.215 m² kapalı alana sahip “Malazgirt MYO” yapım işinin %17’si tamamlanmıştır. Malazgirt MYO Yapım işi 17.11.2022 tarih ve 71297 sayılı rektörlük oluru ile fesih edilmiştir.

Resim 2 Malazgirt MYO



2.6.3 2010H051271 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

"Açık ve Kapalı Spor Tesisleri" projesine baęlı olarak; 2020 yılında ihalesi yeniden yapılan 40.777 m² kapalı alana sahip “Açık Spor Tesisleri” yapım işinin 2022 yılsonu itibari ile

%36'sı tamamlanmıştır. "Açık ve Kapalı Spor Tesisleri" 31.08.2022 tarih ve 60804 sayılı rektörlük oluru ile fesih edilmiştir.

Resim 3 Açık Spor Tesisleri



2.6.4 2010K121230 Merkezi Araştırma Laboratuvarı

"Merkezi Araştırma Laboratuvarı" kapsamında "İleri Araştırma Makine Teçhizat Alımları" yapılmaktadır.

2.6.5 2020K12152015 İhtisaslaşma Projesi (Makine ve Teçhizat Alımı)

"İhtisaslaşma Projesi" kapsamında "Çiftçi Eğitimi ve Hayvan Yetiştiriciliği" alanında çalışmalar yapılmaktadır. Çiftçi Eğitim Merkezi bina yapımı tamamlandıktan sonra Makine ve Teçhizat alımları yapılacaktır.

2.6.6 2022H03186907 Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi

"Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi" kapsamında; 2022 yılı içerisinde proje çizimleri yapılmıştır.

2.6.7 2022H03186903 Muhtelif İşler

"Muhtelif İşler" kapsamında; "Bina Bakım-Onarım, Menkul Malların Büyük Onarımı, Bilgisayar, Taşıt, Yazılım Alımları, Makine Teçhizat ve Mefruşat" ile ilgili mal ve hizmet alımları yapılmıştır.

2.6.8 2022H03186905 Yayın Alımları

"Yayın Alımları" kapsamında 2022 yılı içerisinde "Basılı Yayın Alımı" ve "Elektronik Yayın Alımı" yapılmıştır.

2.7 Hibe Kapsamındaki Yatırımlar

Resim 4 Sultan Muhammed Alparslan Camii



Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yapımı üstlenilen Sultan Muhammed Alparslan Camii'sinin peyzaj çalışmaları devam etmektedir.

Resim 5 Gazze Camii



Muş Alparslan Üniversitesi Kalkındırma Vakfı tarafından yapımı üstlenilen Gazze Camii'sinin inşaat çalışmaları devam etmektedir.

2.8 2022 Yılı Yatırım Uygulamaları

2.8.1 Genel Yatırım Uygulama Durumu

2022 yılı yatırım programında, Üniversitemiz için 31.702.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde yapılan eklemeler ve aktarma sonucunda ödenek toplamı 45.223.000₺'ye ulaşmıştır. Tahsis edilen ödenekten 16.508.412₺ harcama yapılmış, harcanmayan 28.714.588₺ ise yılsonunda tenkis edilmiştir. Harcamanın ödeneğe oranı %36'dır.

2.8.2 Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

Çok yıllık proje ödeneklerinin talep edilen düzeyde tahsis edilememesi; yatırımların tamamlanma sürecinin uzamasına ve yatırım maliyetlerinin her geçen yıl artmasına neden olmaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 62'nci maddesinin (ı) fıkrasında; "21 ve 22'nci maddelerindeki parasal limitler dâhilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10'unu Kamu İhale Kurulu'nun uygun görüşü olmadıkça aşamaz." denilmektedir. Bu durum; Kamu İhale Kurulu'nun görüşü gereken hallerde, ihalelerin ve alımların yapılması sürecinde, zaman kaybına neden olmaktadır. Ayrıca aciliyet arz eden durumlarda yapılacak ihale ve alımlara engel teşkil etmektedir.

3. 2022 YILI PROJE UYGULAMALARI

3.1 Devam Eden Projeler

3.1.1 Kamu Yatırım Projeleri

3.1.1.1 2009HO3152561 Kampüs Altyapısı

"Kampüs Altyapısı" projesi kapsamında, 2022 yılı bütçesinden 1.500.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenekten 973.033₺ harcama yapılmıştır. Harcamanın ödeneğe oranı %64'tür.

3.1.1.2 2009H031067 Derslik ve Merkezi Birimler

"Derslik ve Merkezi Birimler" projesi kapsamında, 2022 yılı bütçesinden 13.000.000₺ ödenek tahsis edilmiş, yapılan aktarma sonucunda ödeneğin toplamı 23.000.000₺'ye ulaşmıştır. Tahsis edilen ödenekten 458.865₺ harcama yapılmıştır. Harcamanın ödeneğe oranı %2'dir.

3.1.1.3 2010H051271 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

“Açık ve Kapalı Spor Tesisleri” projesi kapsamında, 2022 yılı bütçesinden 2.500.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenekten 325.176₺ harcama yapılmıştır. Harcamanın ödeneğe oranı %13’tür.

3.1.1.4 2010K121230 Merkezi Araştırma Laboratuvarı

"Merkezi Araştırma Laboratuvarı" için 2022 yılı bütçesinden ileri araştırma makine-teçhizat alımları kapsamında, 2.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenekten harcama yapılmamıştır

3.1.1.5 2020K12152015 İhtisaslaşma Projesi (Makine ve Teçhizat Alımı)

"İhtisaslaşma Projesi" için 2022 yılı bütçesinden Çiftçi Eğitimi ve Hayvan Yetiştiriciliği kapsamında, 3.000.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenekten 1.211.271₺ harcama yapılmıştır. Harcamanın ödeneğe oranı %40’tır.

3.1.1.6 2022H03186907 Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi

“Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi” için 2022 yılı bütçesinden 200.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. 2022 yılsonu itibariyle 116.820₺ harcama yapılmıştır. Harcamanın ödeneğe oranı %58’dir.

3.1.1.7 2022H0386903 Muhtelif İşler

"Muhtelif İşler" için 2022 yılı bütçesinden 7.000.000₺ ödenek tahsis edilmiş, yapılan ekleme ve aktarma sonucunda ödeneğin toplamı 14.521.000₺’ye ulaşmıştır. Tahsis edilen ödenekten 13.224.842₺ harcama yapılmıştır. Harcamanın ödeneğe oranı %91’dir.

3.1.1.7.1 Yazılım Alımları

2022 yılı bütçesinden Yazılım Alımları giderleri için 300.000₺ ödenek tahsis edilmiş, yapılan ekleme sonucunda ödeneğin toplamı 1.000.000₺’ye ulaşmıştır. Ödeneğin 873.928₺’si harcanmıştır. Harcamanın ödeneğe oranı %87’dir.

3.1.1.7.2 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri

2022 yılı bütçesinden Menkul Malların Büyük Onarım Giderlerine yapılan ekleme sonucunda 321.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenekten 311.631₺ harcama yapılmıştır. Harcamanın ödeneğe oranı %97'dir.

3.1.1.7.3 Bina Bakım-Onarım Giderleri

2022 yılı bütçesinden binaların bakım ve onarım giderleri için 1.000.000₺ ödenek tahsis edilmiş, yapılan ekleme ve aktarma sonucunda ödeneğin toplamı 7.000.000₺'ye ulaşmıştır. Ödeneğin 6.670.735₺'si harcanmıştır. Harcamanın ödeneğe oranı %95'tir.

Tablo 4

Yapılan İşin Adı	Mevcut Ödenek Tutarı (TL)	Harcanan Tutar (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
Hizmet Binası Bakım ve Onarım	7.000.000	6.670.735	%95
Toplam	7.000.000	6.670.735	%95

3.1.1.7.4 Makine-Teçhizat ve Mefruşat Alımları

2022 yılı bütçesinden makine, teçhizat ve mefruşat alımları için yapılan eklemelerle birlikte 3.825.274₺ ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonu itibariyle tamamı harcanmıştır. Harcamanın ödeneğe oranı %100'dür.

Tablo 5

Alınan Malzeme	Mevcut Ödenek Tutarı (TL)	Harcanan Tutar (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
Büro Mefruşatı Alımları	3.825.274	945.122	%100
İşyeri Mefruşatı Alımları		51.684	
Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları		77.104	
Diğer Mefruşat Alımları		93.807	
Büro Makinaları Alımları		1.086.492	
İşyeri Makine Teçhizat Alımları		5.074	
Diğer Makine Teçhizat Alımları		729.733	
Okul mefruşat Alımları		944	
Diğer Yayın Alımları ve Yapımları		7.080	
Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korunması Giderleri		370.757	
Tamir Bakım Aleti Alımları		34.716	
Diğer Avadanlık Alımları		190.094	

Atölye Gereçleri Alımları		85.550	
Laboratuvar Gereç Alımları		64.517	
Laboratuvar Cihaz Alımları		82.600	
Toplam	3.825.274	3.825.274	%100

3.1.1.7.5 Bilgisayar Alımları

2022 yılı bütçesinden bilgisayar alımı için 500.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Yapılan eklemelerle ödenekten 1.543.274₺'si harcanmıştır. Harcamanın ödeneye oranı %300'dür.

Tablo 6

Alınan Malzeme	Mevcut Ödenek Tutarı (TL)	Harcanan Tutar (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
Bilgisayar Alımları	500.000	1.543.274	% 300
Toplam	500.000	1.543.274	% 300

3.1.1.8 2022H03186905 Yayın Alımları

"Yayın Alımları" için 2022 yılı bütçesinden yayın alımları kapsamında 500.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenekten 198.405₺ harcama gerçekleşmiştir. Harcamanın ödeneye oranı %40'tır.

Tablo 7

Yapılan İşin Adı	Mevcut Ödenek Tutarı (TL)	Harcanan Tutar (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	200.000	138.824	%69
Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları	300.000	59.581	%19
Toplam	500.000	198.405	%40

3.2 TAMAMLANAN PROJELER

3.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi

Tablo 8

Bağlı Olduğu Proje No	Proje Adı	Proje Sahibi Kuruluş
2009HO3152561	Kampüs Altyapısı (Genel)	Muş Alparslan Üniversitesi

Kampüs Altyapısı” projesine bağlı olarak, 2022 yılında ihalesi yapılan “Kampüs Altyapı Tadilatları ve Çarşı Binası Çevre Düzenleme Yapım İş”, “Ağaçlandırma Alanları Damla sulama

Yapım İşi” ve “Trafo ve Jeneratör Grupları Deplase Yapım İşi” 2022 yılsonu itibariyle % 100’ü tamamlanmıştır.

3.2.2 Proje Tamamlanma Raporu

2022 yılı içinde tamamlanan projelerin detay bilgileri aşağıdaki “Proje Tamamlanma Raporu” başlıklı tablolarda verilmiştir.

Tablo 9

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri				Revize Edilmiş Son Değerler	
Proje No	2009HO3152561					
Proje Adı	Kampüs Altyapısı (Genel) 1) Kampüs Altyapı Tadilatları ve Çarşı Binası Çevre Düzenleme					
Sektör/Alt Sektör	Eğitim					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Muş Alparslan Üniversitesi Kampüsü					
Karakteristiği						
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2022-2022					
Proje Sözleşmesi Tarihi	21.09.2022		İhale Sözleşme Bedeli		312.500,00	
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Başlangıç Ödeneği	Kamulaştırma
369.809,48					1.500.000	
Yıllar İtibariyle Yapılan Harcama						
Cari Fiyatlarla						
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl						
2022		397.507,00			397.507,00	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Beklenen ve Elde Edilen Fayda	Külliyesimde her geçen gün artan öğrenci, akademik ve idari personelin daha kaliteli yaşam sürdürebilmesi için bu projelere ihtiyaç duyulmuştur. Projeler sayesinde külliyesimde daha iyi şartlar sağlanmıştır.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkıları	Külliyesimin gelişmesine paralel olarak kaliteli yaşam sorunlarının asgari seviyeye düşürülmesi.					
Yapılan İşler-Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar-Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	İhale sürecinde herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Uzayan ihale süreçlerine karşılık, projelerin yatırım programına erken alınmasının sağlanması, ihale sürecine başlanması ve devam edebilecek itirazlar, çevresel etkenler ve teknik donanımlar gerektiren hususlar nedeni ile ihale sürecinin kurumun ihtiyacı olan zamanda tamamlanması.					

Tablo 9.1

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2009HO3152561					
Proje Adı	Kampüs Altyapısı (Genel) 1) Ağaçlandırma Alanları Damla sulama Yapım İşi					
Sektör/Alt Sektör	Eğitim					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Muş Alparslan Üniversitesi Kampüsü					
Karakteristiği						
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2022-2022					
Proje Sözleşmesi Tarihi	21.09.2022		İhale Sözleşme Bedeli	332.417,35		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Başlangıç Ödeneği	Kamulaştırma
300.229,84					1.500.000	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
Cari Fiyatlarla						
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl						
2022		368.750,00			368.750,00	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Fayda	Külliyyemizde her geçen gün artan öğrenci, akademik ve idari personelin daha kaliteli yaşam sürdürebilmesi için bu projelere ihtiyaç duyulmuştur. Projeler sayesinde külliyyemizde daha iyi şartlar sağlanmıştır.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkıları	Külliyyemizin gelişmesine paralel olarak kaliteli yaşam sorunlarının asgari seviyeye düşürülmesi.					
Yapılan İşler-Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar-Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	İhale sürecinde herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Uzayan ihale süreçlerine karşılık, projelerin yatırım programına erken alınmasının sağlanması, ihale sürecine başlanması ve devam edebilecek itirazlar, çevresel etkenler ve teknik donanımlar gerektiren hususlar nedeni ile ihale sürecinin kurumun ihtiyacı olan zamanda tamamlanması.					

Tablo 9.2

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2009HO3152561					
Proje Adı	Kampüs Altyapısı (Genel) 1) “Trafo ve Jeneratör Grupları Deplase Yapım İşİ					
Sektör/Alt Sektör	Eğitim					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Muş Alparslan Üniversitesi Kampüsü					
Karakteristiği						
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2022-2022					
Proje Sözleşmesi Tarihi	05.07.2022		İhale Sözleşme Bedeli	156.252,47		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Başlangıç Ödeneği	Kamulaştırma
156.252,47					1.500.000	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
Cari Fiyatlarla						
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl						
2022		156.252,47			156.252,47	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Fayda	Külliyyemizde her geçen gün artan öğrenci, akademik ve idari personelin daha kaliteli yaşam sürdürebilmesi için bu projelere ihtiyaç duyulmuştur. Projeler sayesinde külliyyemizde daha iyi şartlar sağlanmıştır.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkıları	Külliyyemizin gelişmesine paralel olarak kaliteli yaşam sorunlarının asgari seviyeye düşürülmesi.					
Yapılan İşler-Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar-Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	İhale sürecinde herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Uzayan ihale süreçlerine karşılık, projelerin yatırım programına erken alınmasının sağlanması, ihale sürecine başlanması ve devam edebilecek itirazlar, çevresel etkenler ve teknik donanımlar gerektiren hususlar nedeni ile ihale sürecinin kurumun ihtiyacı olan zamanda tamamlanması.					

ÖNERİLER

- a-** Üniversitemizin fiziki yapısının daha kısa sürede tamamlanabilmesi için yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerimizin maksimum düzeyde karşılanması,
- b-** Kuruluş aşamalarını tamamlama sürecinde bulunan üniversiteler; kalifiye teknik ve idari personelin temininde zorluklar yaşadığından, bu kadrolara atanacak personelin özlük haklarının iyileştirilmesi ve akademik personele ödenen geliştirme ödeneğinden faydalandırılması,
- c-** 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62'nci maddesinin (1) fıkrasında; “21 ve 22'nci maddelerindeki parasal limitler dâhilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin % 10'unu Kamu İhale Kurulu'nun uygun görüşü olmadıkça aşamaz” denilmektedir. Kuruluş aşamalarını tamamlama sürecinde bulunan üniversitelerin fiziki yapıları, kampüs altyapıları ve makine teçhizat ile diğer alımlar için aciliyet arz eden ihtiyaçları karşılamak üzere bu maddeler kapsamında yapılacak harcamaların, Kamu İhale Kurulunun görüşü olmaksızın, ödeneklerin en az %50'sine kadar harcama izninin verilmesi şeklinde değiştirilmesi önem arz etmektedir. Yukarıda belirtilen öneriler dikkate alındığı takdirde daha etkin ve verimli hizmetlerin gerçekleşeceği öngörülmektedir.



İLETİŞİM

Web : www.alparslan.edu.tr

E-mail : strateji@alparslan.edu.tr

Tel : 0 (436) 249 49 49

Faks : 0 (436) 249 10 22

Adres : Muş Alparslan Üniversitesi Külliyesi
49250 - Muş
